

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAÍ

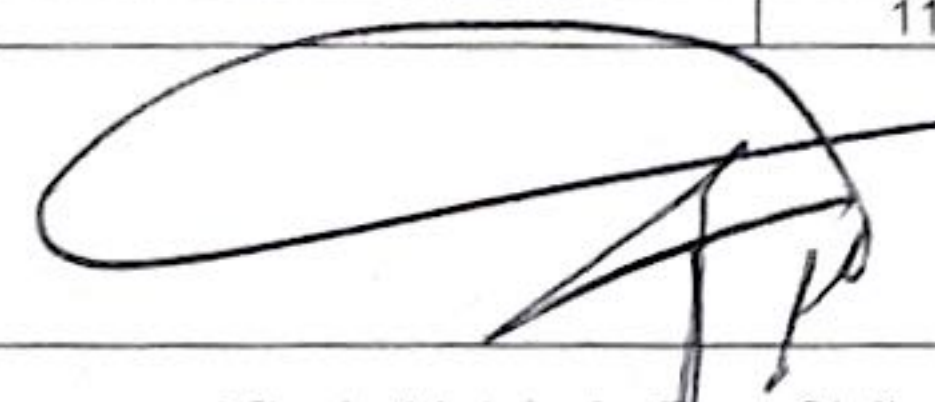
CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO

Local: Av. Alberto Pasqualine, esquina com Av. Flores da Cunha

REFORMA PARCIAL DO PISO DO PRÉDIO UPA DE TRAMANDAÍ - TRECHO 02

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANTIDADE	TOTAL	%	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS	
					% mês	R\$	% mês	R\$	% mês	R\$
1	SERVIÇOS INICIAIS	1,00	1 096,0700	0,83%	100,00%	R\$ 1 096,07		R\$ -		R\$ -
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	1,00	14 966,9400	11,32%	75,00%	R\$ 11 225,20	25,00%	R\$ 3 741,74		R\$ -
3	LAJE E CONTRAPISO	1,00	5 281,6000	4,00%	50,00%	R\$ 2 640,80	50,00%	R\$ 2 640,80		R\$ -
4	COLOCAÇÃO DE PISO E RODAPÉ	1,00	109 783,0700	83,04%		R\$ -	70,00%	R\$ 76 848,15	30,00%	R\$ 32 934,92
5	LIMPEZA FINAL DA OBRA	1,00	1 077,4500	0,81%		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 1 077,45
TOTAIS MENSAIS			R\$ 132.205,13	100,00%	11,32%	R\$ 14.962,07	62,96%	R\$ 83.230,69	25,73%	R\$ 34.012,37
TOTAL ACUMULADO (R\$)					11,32%	R\$ 14 962,07	74,27%	R\$ 98.192,76	100,00%	R\$ 132.205,13

Tramandaí, 26 de Julho de 2024


 Flavio Mainieri - Eng. Civil
 CREA-RS 77112
